



ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга



2020 год




СТРУКТУРА РАСХОДОВ АИП 2020 ГОДА

Расходы АИП после корректировки бюджета сокращены на **33%** и составляют

67,7
млрд.

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	2,9 млрд руб.	4,2 %
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	47,8 млрд руб.	70,7 %
ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ПОКУПКА АКЦИЙ)	17,0 млрд руб.	25,1 %

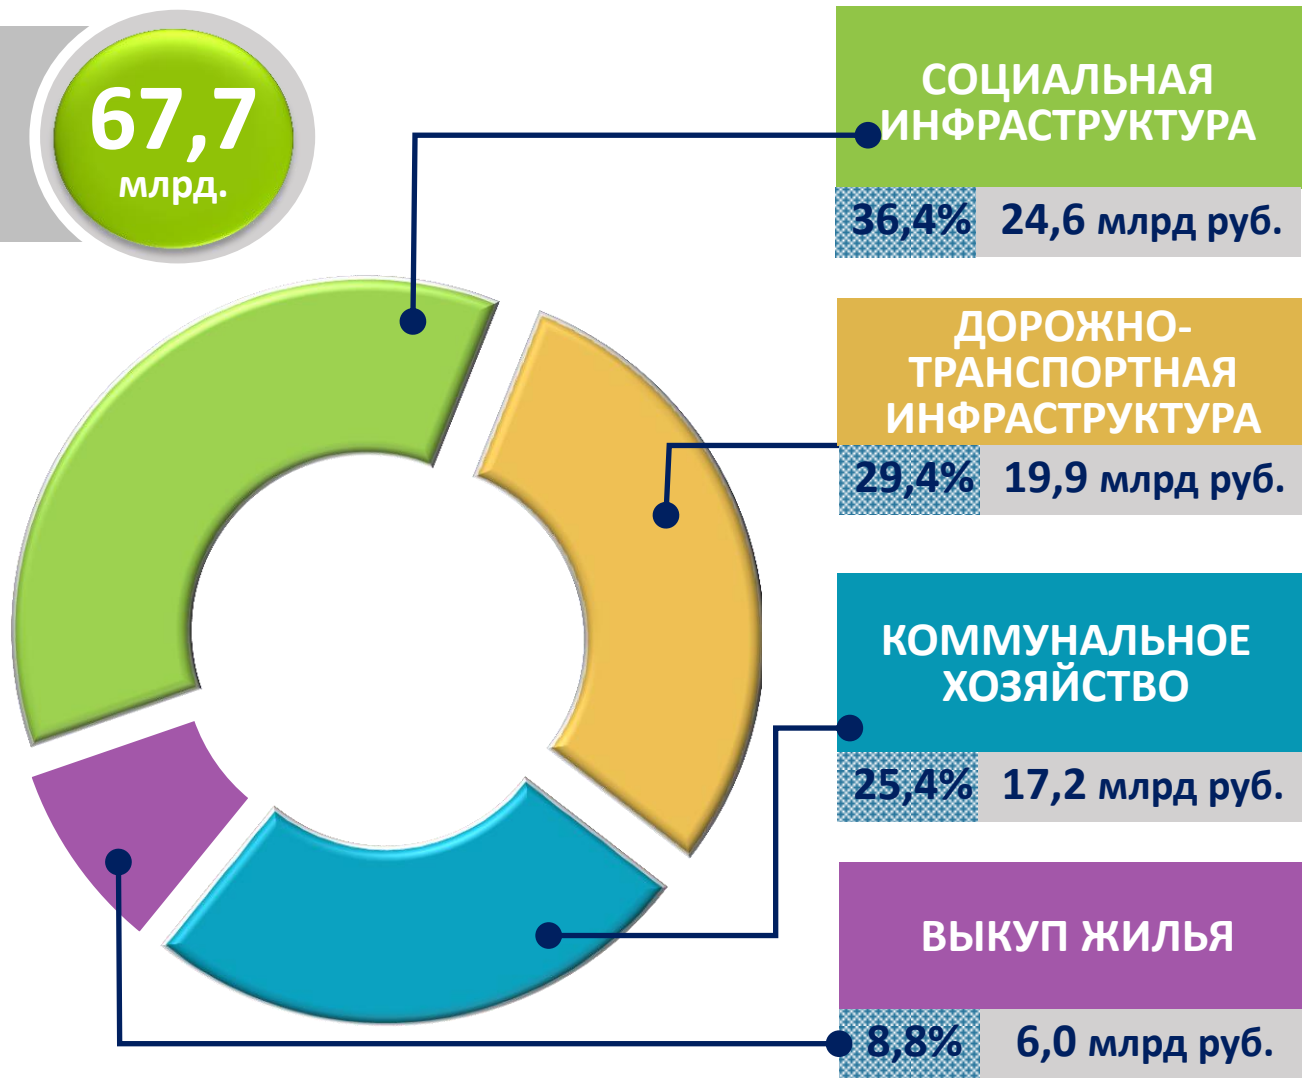




АИП 2020: ИСПОЛНЕНИЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Объем исполнения АИП за I полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

↓ 5%

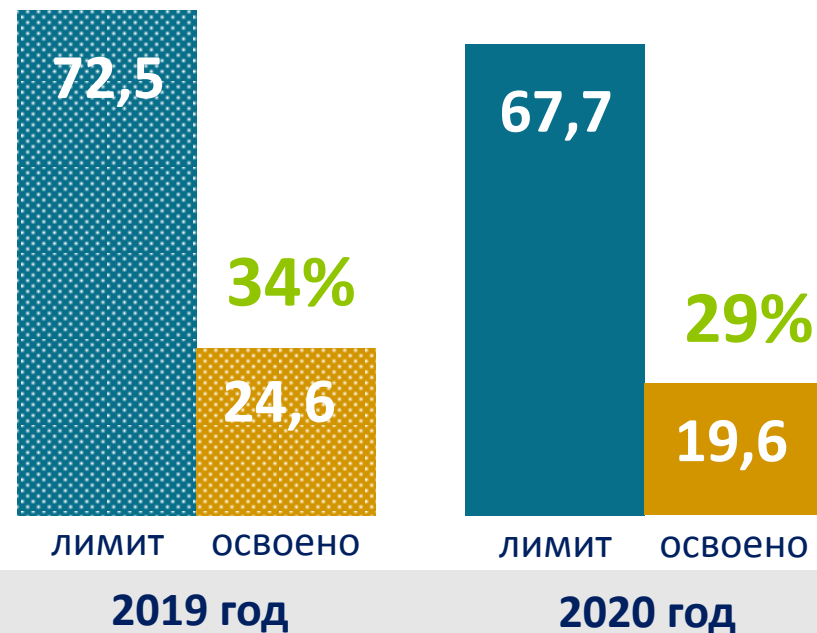

ЗАКАЗЧИК

I полугодие 2020

I полугодие 2019

млрд

Объем > 1 млрд

		лимит	освоено	%	лимит	освоено	%
КС	↑	20,0	7,1	35,4	12,5	3,02	24,2
КИО	↓	15,4	4,6	30,1	18,8	8,2	43,9
КЭИО		13,2	3,4	25,5	14,4	3,8	26,2
КРТИ	↓	17,9	4,4	24,4	25,2	9,0	35,8

Объем < 1 млрд

КТ	↑	0,34	0,14	41,0	0,47	0,06	13,2
КППИТ	↓	0,49	0,0	0,0	0,62	0,31	49,2
КИС	↓	0,37	0,0	0,0	0,46	0,13	28,6



АИП 2020: СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

53
объекта



строительная готовность

25 объектов



22 объекта



23 ДЕТСКИХ САДА

8 ШКОЛ

11 ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


4 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА

3 ОБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ

2 ОБЪЕКТА СПОРТА

1 ЖИЛОЙ ДОМ

1 ЗАГС





АИП 2020: ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

18
объектов

8 объектов

строительная готовность



90-100%

7 объектов



50-90%

- продолжение пр. Ветеранов
- реконструкция ул. Оборонная
- М 11 (Гореловский путепровод)
- реконструкция Богатырского пр.
- Южно-Волхонская дор. (1,3 этап)
- Приморское ш. (2.1 этап)
- участок Комендантского пр.
- участок Индустриального пр.



АИП 2020: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

8

крупных объектов

4 объекта

3 объекта

строительная готовность




90-100%



50-90%

- переключение прямых выпусков р. Карповки
- водопровод до Муринской ВНС
- очистные сооружения «ДЮНЫ»
- тепловая сеть (СПЧ кв. 63)
- инжподготовка кв. 25А Ржевка
- инжподготовка 21 кв. ЮЗПч
- очистные сооружения пос. Молодежное
- магистральные водопроводы в Курортном р-не





За I полугодие 2020 года
получено в собственность
Санкт-Петербурга

697

квартир
для льготных
категорий граждан
и детей-сирот






АИП 2020: ИСПОЛНЕНИЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Санкт-Петербург

динамика
исполнения АИП
за I полугодие

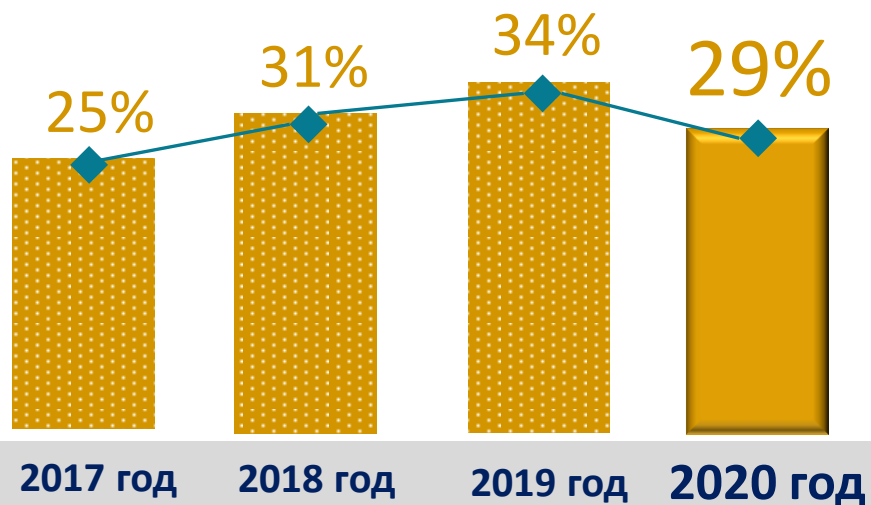

Факторы COVID-19

влияющие на исполнение
АИП за I полугодие 2020 года



ограничения в целях санитарно-эпидемиологического контроля, безопасности и борьбы с инфекцией COVID-19



ухудшение макроэкономических условий, доступности кредитов



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

