



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 апреля 2025 года

№ 157-р

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р**

1. Внести в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга» следующие изменения:

1.1. В методических рекомендациях по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки на поставку нефтепродуктов (топливо моторное, включая автомобильный бензин) по электронным (топливным) картам, являющихся Приложением № 7 к распоряжению (далее – Методические рекомендации № 7):

1.1.1. В пункте 2.6 Приложения № 1 к Методическим рекомендациям № 7 слова «ГОСТ 32513-2013 Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» заменить словами «ГОСТ 32513-2023. Межгосударственный стандарт. Бензин автомобильный. Технические условия».

1.1.2. Абзац третий *Варианта 2* Обоснования начальной (максимальной) цены контракта (в случае отсутствия на дату определения НЦЕ данных Федеральной службы государственной статистики, единой межведомственной информационно-статистической системы и других источников, распространяющих либо предоставляющих статистическую информацию) Приложения № 2 к Методическим рекомендациям № 7 после слов «с применением индексов потребительских цен (далее – ИПЦ), определенных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, одобренном Правительством Российской Федерации» дополнить сноской <16> следующего содержания:

«<16> ИПЦ, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, одобренном Правительством Российской Федерации, опубликованном на сайте Минэкономразвития России в разделе: «Приоритетные направления / Макроэкономика / Прогнозы социально-экономического развития» по адресу:

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_peri_od_2026_i_2027_godov.html».


1.2. В сноске <107> Приложения № 1 к методическим рекомендациям по разработке проектов контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки работ путем проведения электронных процедур, являющимся Приложением № 13 к распоряжению, второе предложение исключить.

1.3. Примеры расчета индекса прогнозной инфляции в Приложении № 2 к методическим рекомендациям по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого является выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений, являющимся Приложением № 19 к распоряжению, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Егорову Е.В.

Председатель Комитета

Д.И.Толстых

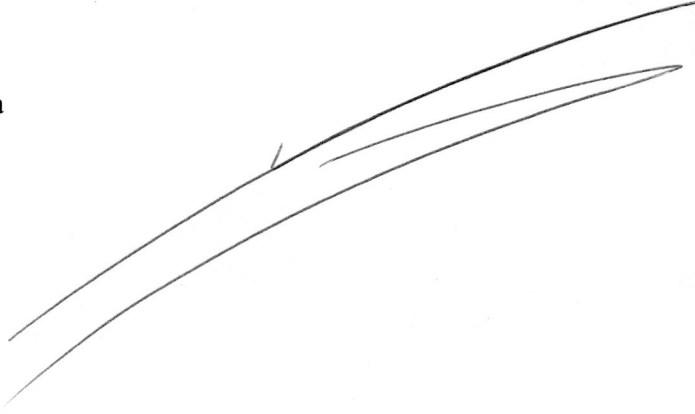

Приложение
к распоряжению Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 07 апреля 2025 года № 157-р

*Пример расчета индекса прогнозной инфляции
для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год*

РАСЧЕТ
индексов фактической и прогнозной инфляции
в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденным приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр

Выполнение работ по капитальному ремонту дороги

Уровень цен утвержденной проектной документации	Июнь 2023
Дата определения НМЦК	IV квартал 2024 ²²
Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией	7 месяцев
Срок начала выполнения СМР	Апрель 2025
Срок окончания выполнения СМР	Октябрь 2025

1. Индексы фактической инфляции:

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28.12.2024
№ 990-р

Капитальный ремонт, прочие – 1,140

ПНР – 1,150

Оборудование, принятое по ТССЦ (ФГИС ЦС) – 1,113

Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу – 1,0872

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 года
(<https://www.fedstat.ru/indicator/57795>)

Июль 2023/	Июнь 2023	101,03%
Август 2023/	Июль 2023	100,73%
Сентябрь 2023/	Август 2023	100,48%
Октябрь 2023/	Сентябрь 2023	100,57%
Ноябрь 2023/	Октябрь 2023	99,97%
Декабрь 2023/	Ноябрь 2023	100,61%
Декабрь 2024/	Декабрь 2023	105,11%

Расчет индекса фактической инфляции:

$$1,0103 \times 1,0073 \times 1,0048 \times 1,0057 \times 0,9997 \times 1,0061 \times 1,0511 = 1,0872$$

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – КЭПиСП) от 09.01.2025 № 1-р.

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства объекта (04.2025 по 11.2025):

$$(1,0254^{23} + 1,0647^{24}) / 2 = 1,0451$$

²² За дату определения НМЦК принимается квартал, установленный для определения индексов фактической инфляции.

²³ 1,0254 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024» и Месяца начала выполнения работ «Апрель 2025»

²⁴ 1,0647 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024» и Месяца окончания выполнения работ «Октябрь 2025»

*Пример расчета индекса прогнозной инфляции
для периода выполнения работ, превышающего один календарный год,
но не превышающего три года*

РАСЧЕТ

индексов фактической и прогнозной инфляции
в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр

Выполнение работ по капитальному ремонту дороги

Уровень цен утвержденной проектной документации	Июнь 2023
Дата определения НМЦК	IV квартал 2024 ²⁵
Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией	31 месяц
Срок начала выполнения СМР	Апрель 2025
Срок окончания выполнения СМР	Октябрь 2027

1. Индексы фактической инфляции:

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28.12.2024 № 990-р

Капитальный ремонт, прочие – 1,140

ПНР – 1,150

Оборудование, принятое по ТССЦ (ФГИС ЦС) – 1,113

Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу – 1,0872

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 года
(<https://www.fedstat.ru/indicator/57795>)

Июль 2023/	Июнь 2023	101,03%
Август 2023/	Июль 2023	100,73%
Сентябрь 2023/	Август 2023	100,48%
Октябрь 2023/	Сентябрь 2023	100,57%
Ноябрь 2023/	Октябрь 2023	99,97%
Декабрь 2023/	Ноябрь 2023	100,61%
Декабрь 2024/	Декабрь 2023	105,11%

Расчет индекса фактической инфляции:

$$1,0103 \times 1,0073 \times 1,0048 \times 1,0057 \times 0,9997 \times 1,0061 \times 1,0511 = 1,0872$$

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 № 1-р

Индекс прогнозной инфляции 2025 год: $(1,0254^{26} + 1,0782^{27})/2 = 1,0518$

Индекс прогнозной инфляции 2026 год: $1,0782^{28} * ((1,0043^{29} + 1,0526^{30})/2) = 1,1089$

Индекс прогнозной инфляции 2027 год: $1,1349^{31} * ((1,0036^{32} + 1,0367^{33})/2) = 1,1575$

Доля выполняемых работ³⁴:

2025 $9^{35}/31^{36} = 0,29$

2026 $12/31 = 0,39$

2027 $10/31 = 0,32$

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства объекта:

$$0,29 * 1,0518 + 0,39 * 1,1089 + 0,32 * 1,1575 = 1,1079$$

²⁵ За дату определения НМЦК принимается квартал, установленный для определения индексов фактической инфляции.

²⁶ 1,0254 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024» и Месяца начала выполнения работ «Апрель 2025».

²⁷ 1,0782 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024» и Месяца окончания выполнения работ «Декабрь 2025».

²⁸ 1,0782 – значение принято по Таблице 2 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024», нарастающий итог на «Декабрь 2025».

²⁹ 1,0043 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца начала выполнения работ «Январь 2025».

³⁰ 1,0526 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца окончания выполнения работ «Декабрь 2026».

³¹ 1,1349 – значение принято по Таблице 2 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024», нарастающий итог на «Декабрь 2026».

³² 1,0036 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца начала выполнения работ «Январь 2027».

³³ 1,0367 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца окончания выполнения работ «Октябрь 2027».

³⁴ Величина доли стоимости строительства на каждый год определяется как отношение количества месяцев, на которые приходится выполнение работ к общей продолжительности строительства.

³⁵ 9, 12, 10 – количество месяцев выполнения работ соответственно в 2025, 2026 и 2027 году.

³⁶ 31 – продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией.

*Пример расчета индекса прогнозной инфляции
для периода выполнения работ, превышающего три года, при отсутствии утвержденных
прогнозных индексов инфляции*

РАСЧЕТ

индексов фактической и прогнозной инфляции
в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр

Выполнение работ по капитальному ремонту дороги

Уровень цен утвержденной проектной документации	Июнь 2023
Дата определения НМЦК	IV квартал 2024 ³⁷
Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией	43 месяца
Срок начала выполнения СМР	Апрель 2025
Срок окончания выполнения СМР	Октябрь 2028

1. Индексы фактической инфляции:

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28.12.2024 № 990-р

Капитальный ремонт, прочие – 1,140

ПНР – 1,150

Оборудование, принятое по ТССЦ (ФГИС ЦС) – 1,113

Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу – 1,0872

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 года
(<https://www.fedstat.ru/indicator/57795>)

Июль 2023/	Июнь 2023	101,03%
Август 2023/	Июль 2023	100,73%
Сентябрь 2023/	Август 2023	100,48%
Октябрь 2023/	Сентябрь 2023	100,57%
Ноябрь 2023/	Октябрь 2023	99,97%
Декабрь 2023/	Ноябрь 2023	100,61%
Декабрь 2024/	Декабрь 2023	105,11%

Расчет индекса фактической инфляции:

$$1,0103 \times 1,0073 \times 1,0048 \times 1,0057 \times 0,9997 \times 1,0061 \times 1,0511 = 1,0872$$

2. Индексы прогнозной инфляции:

Для 2025-2027 годов принимаются индексы в соответствии с Распоряжением КЭПиСП от 09.01.2025 № 1-р,

Для 2028 года принимается индекс-дефлятор Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал» в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Ежемесячный прогнозный индекс на 2028: $^{12}\sqrt{1,04^{38}} = 1,0033$

Индекс прогнозной инфляции 2025 год: $(1,0254^{39} + 1,0782^{40})/2 = 1,0518$

Индекс прогнозной инфляции 2026 год: $1,0782^{41} * ((1,0043^{42} + 1,0526^{43})/2) = 1,1089$

Индекс прогнозной инфляции 2027 год: $1,1349^{44} * ((1,0036^{45} + 1,0442^{46})/2) = 1,1620$

Индекс прогнозной инфляции на 2028 год:

$(1,1349^{47} * 1,0442^{48} * (1,0033 + 1,0033^{10(49)})/2) = 1,2069$

Доля выполняемых работ⁵⁰:

2025 $9^{51}/43^{52} = 0,21$

2026 $12/43 = 0,28$

2027 $12/43 = 0,28$

2028 $10/43 = 0,23$

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства объекта (04.2025-10.2028):

$0,21 * 1,0518 + 0,28 * 1,1089 + 0,28 * 1,1620 + 0,23 * 1,2069 = 1,1343$

³⁷ За дату определения НМЦК принимается квартал, установленный для определения индексов фактической инфляции.

³⁸ 104 % - индекс-дефлятор Минэкономразвития России на 2028 год по строке «Инвестиции в основной капитал», опубликованный на сайте Минэкономразвития России в разделе: «Деятельность / Макроэкономика / Прогнозы социально-экономического развития» по адресу:

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html

³⁹ 1,0254 – значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024» и Месяца начала выполнения работ «Апрель 2025».

⁴⁰ 1,0782 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024» и Месяца окончания выполнения работ «Декабрь 2025».

⁴¹ 1,0782 - значение принято по Таблице 2 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024», нарастающий итог на «Декабрь 2025».

⁴² 1,0043 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца начала выполнения работ «Январь 2025».

⁴³ 1,0526 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца окончания выполнения работ «Декабрь 2026».

⁴⁴ 1,1349 - значение принято по Таблице 2 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024», нарастающий итог на «Декабрь 2026».

⁴⁵ 1,0036 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца начала выполнения работ «Январь 2027».

⁴⁶ 1,0442 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца окончания выполнения работ «Декабрь 2027».

⁴⁷ 1,1349 - значение принято по Таблице 2 распоряжения КЭПиСП для месяца определения НМЦК «IV квартал 2024», нарастающий итог на «Декабрь 2026».

⁴⁸ 1,0442 - значение принято по Таблице 1 распоряжения КЭПиСП для месяца окончания выполнения работ «Декабрь 2027».

⁴⁹ 10 – количество месяцев выполнения работ в 2028 году, принимается в соответствии со сроками окончания работ.

⁵⁰ Величина доли стоимости строительства на каждый год определяется как отношение количества месяцев, на которые приходится выполнение работ к общей продолжительности строительства.

⁵¹ 9, 12, 12, 10 – количество месяцев выполнения работ соответственно в 2025, 2026, 2027 и 2028 году.

⁵² 43 – продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией.
